CRONOPROGRAMMA

Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	Area	N. squadre	Comp. squadre	Tot. lav.	Prod. g. sq	Impresa esecutrice
Diagramma di Gantt	183/261	09/01/2018						
Allestimento cantiere	5/7	09/01/2018	Intero cantiere	1	4	4	0	
Allestimento recinzione area di cantiere	5/7	09/01/2018	Intero cantiere	1	4	4	0	
Scavi, sbancamenti per lavori stradali	30/40	15/01/2018	Intero cantiere	1	6	6	0	da definire
Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura	75/108	22/01/2018	Intero cantiere	1	4	4	12	
Rinfianco e rinterro tubazioni	50/75	01/03/2018	Intero cantiere	1	3	3	400	da definire
Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione	20/29	20/03/2018	Intero cantiere	1	0	0	0	da definire
Formazione blocco di fondazione getto con autobetoniera	20/29	21/03/2018	Intero cantiere	1	4	4	3	da definire
Posa di palo di sostegno con gru su autocarro	15/23	16/04/2018	Intero cantiere	1	4	4	2	da definire
Posa di plafoniera su palo di sostegno	20/30	16/04/2018	Intero cantiere	1	4	4	4	da definire
Opere in c.a. per lavori stradali	30/42	12/05/2018	Intero cantiere	1	6	6	0	da definire
Compattazione meccanica del terreno	28/38	21/05/2018	Intero cantiere	1	4	4	0	da definire
Stesa manti bituminosi	15/19	11/06/2018	Intero cantiere	1	6	6	0	da definire
Marciapiedi	20/29	01/05/2018	Intero cantiere	1	2	2	22	da definire
Smantellamento dell'area di cantiere	5/7	02/06/2018	Intero cantiere	1	4	4	0	da definire
Smobilizzo cantiere	2/2	25/09/2018	Intero cantiere	1	0	0	0	

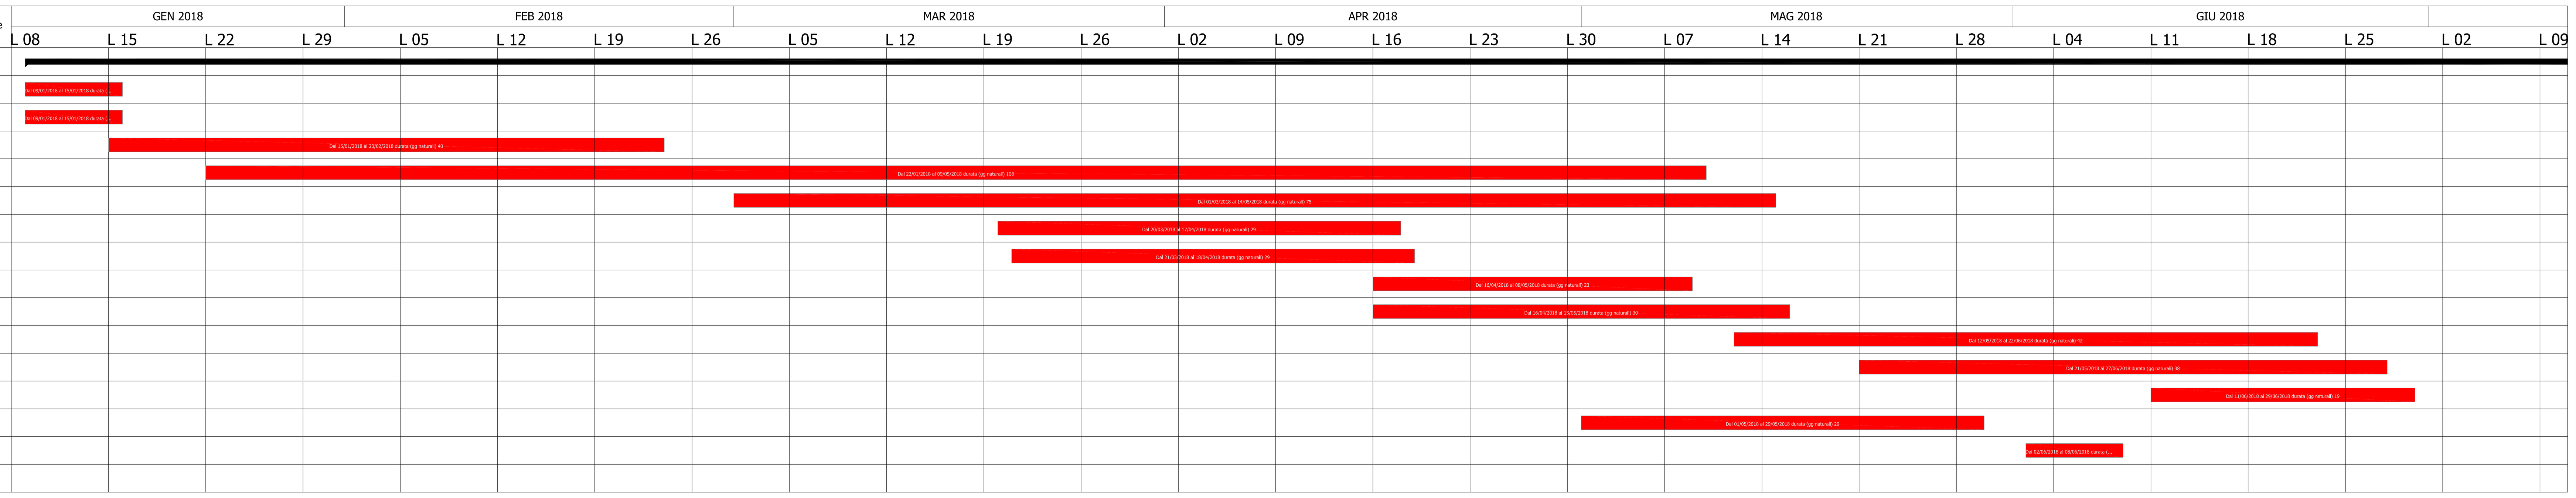

COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI

Provincia di Lodi

IL PROGETTISTA:

Arch. Massimo Pavesi
Via dei Tigli n. 16
26900 Lodi

OPERE DI URBANIZZAZIONE PL 1

PROGETTO DEFINITVO/ESECUTIVO
CRONOPROGRAMMA

DIRETTORE LAVORI:

Arch. Massimo Pavesi
Via dei Tigli n. 16
26900 Lodi

TAVOLA: 10

DATA: 06-12-2017

Architetto Massimo Pavesi
Via dei Tigli n. 16 26900 Lodi
Tel. 0371-750671 fax 0371-438154
e-mail: info.architettopavesi@gmail.com
c.f. PVS MSM 56T11 E648S p. iva 06128880157
